




REGIONE CALABRIA – DIP. 2 – PRESIDENZA
SETTORE FORESTE E FORESTAZIONE



COMUNE DI BIVONGI
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

PROGETTO DI TAGLIO E STIMA DEL VALORE DI MACCHIATICO DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DALL'UTILIZZAZIONE DEL BOSCO "MULINELLA" DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BIVONGI

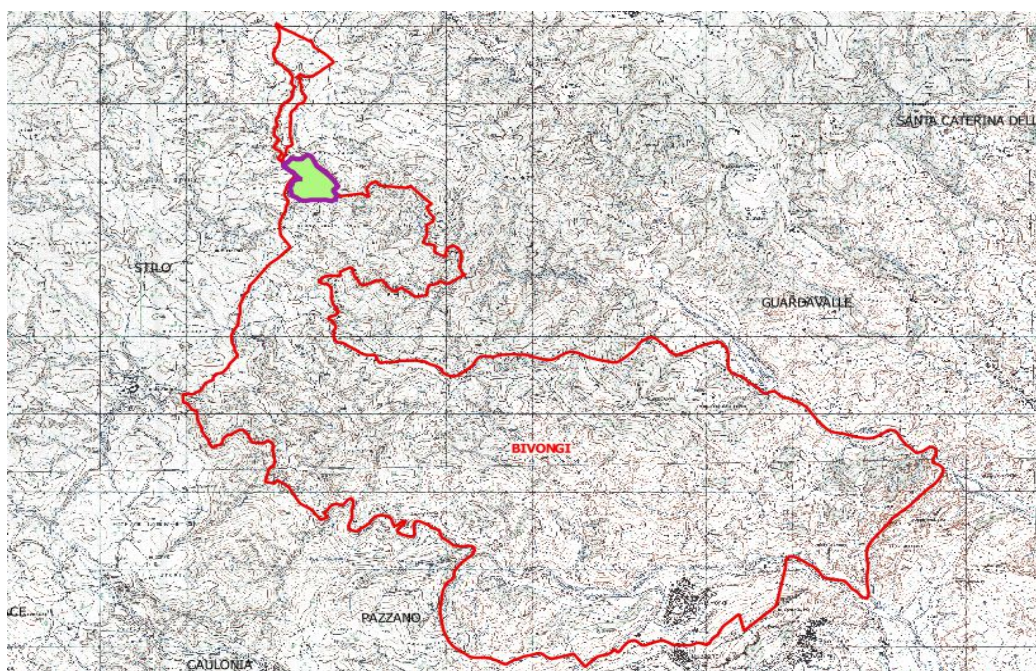


TAV. 1.1 - [CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI]

Bivongi, lì _____

Il Tecnico

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DIAGRAMMA TEMPORALE

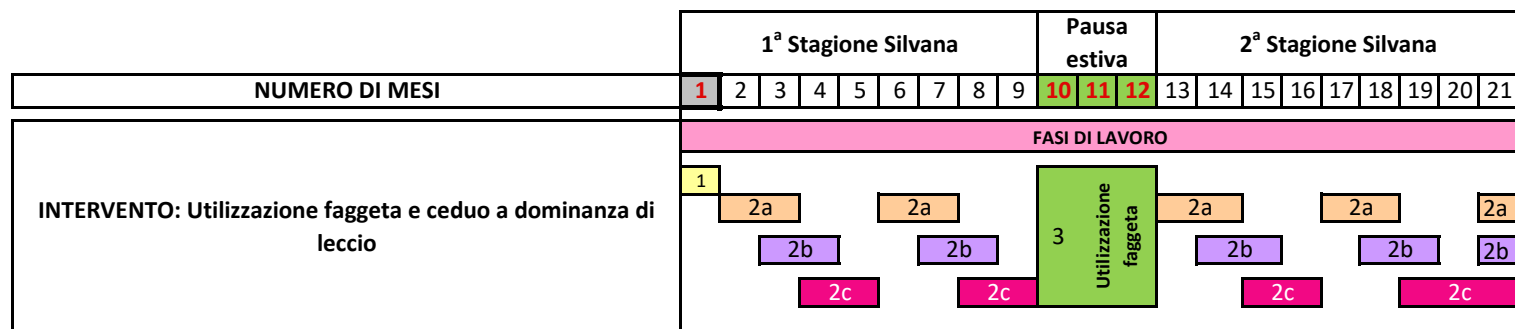

ARTICOLAZIONE DELLE FASI LAVORATIVE

FASI LAVORATIVE		SUB FASI LAVORATIVE	
FASE 1: Predisp. cantiere	1	Installazione del cantiere - 1 settimana	
<i>durata 1 settimana</i>			
FASE 2: Utilizzazione lecceta	2a	Taglio e abbattimento di piante - 10 mesi (relativi)	
<i>durata 34 mesi consecutivi</i>	2b	Concentramento materiale - 10 mesi (relativi)	
	2c	Carico su autocarro ed esbosco - 10 mesi (relativi)	
FASE 3: Utilizzazione pineta	3	Taglio e sgombero di piante - 8 mesi (relativi)	
		<i>L'utilizzazione della pineta avverrà nei mesi estivi (da maggio a settembre) durante la chiusura della stagione silvana, al fine di ottimizzare i tempi d'intervento</i>	
FASE 3: Dmiss. cantiere	4	Dismissione del cantiere - 1 settimana	
<i>durata 1 settimana</i>			

} fasi contemporanee

I lavori di utilizzazione prevedono diverse fasi: una preliminare di predisposizione del cantiere, una di utilizzazione vera e propria ed una conclusiva di dismissione del cantiere. La fase di utilizzazione a sua volta comprende tre sub-fasi che si svolgono in sequenza e si ripetono man mano che la superficie boschiva viene percorsa dall'intervento.

N.B. Il cronoprogramma dei lavori può essere soggetto a slittamenti dovuti all'iter autorizzativo ed alle procedure di aggiudicazione, nonché all'andamento meteorologico, pertanto lo schema è da ritenere puramente indicativo.
